



ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
							05.11.23	06.11.23	13.11.23	20.11.23	27.11.23																							
							S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č					
1			Obnova povrchů komunikací v obci Lhotka 2023	15 dní	06.11. 23	20.11. 23																												
2			DIO, příprava staveniště	1 den	06.11. 23	06.11. 23																												
3			frezování asfaltové vrstvy	1 den	07.11. 23	07.11. 23																												
4			prvky zklidnění dopravy A,G a H	4 dny	08.11. 23	11.11. 23																												
5			výšková úprava uličních vpustí	3 dny	12.11. 23	14.11. 23																												
6			výšková úprava povrchových znaků IS	2 dny	15.11. 23	16.11. 23																												
7			pokládka asfaltových vrstev	1 den	17.11. 23	17.11. 23																												
8			zálivky, dokončovací práce, úklid	2 dny	18.11. 23	19.11. 23																												
9			předání stavby	1 den	20.11. 23	20.11. 23																												

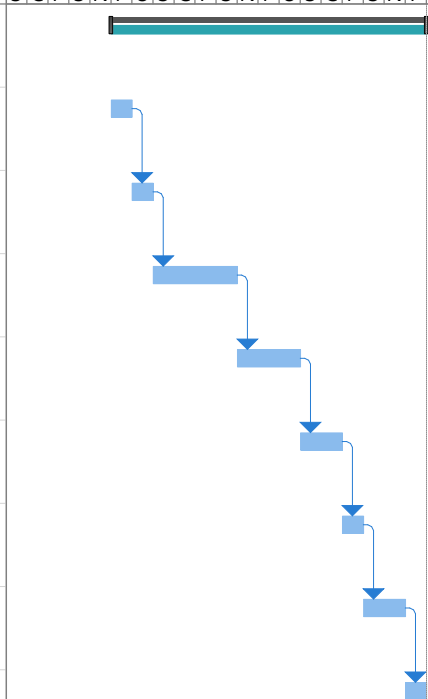

Projekt: harmonogram Datum: 24.10. 23	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			
